

Руководитель
регионального проекта —
Чинаров Александр Александрович



(подпись)

05.11.2019






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА


"(G5-11) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Наличие критических отклонений</i>	<i>Сведения не представлены</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1		3. Цели и показатели	Неправильный расчет показателя, Причина риска: Управление Роспотребнадзора по НАО при расчете показателя по "Доли городского населения" не учитывала население проживающее в поселке искателей как городское, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые: Неправильный расчет формулы	Предлагаемые решения: 1. Изменение конечных показателей, срок исполнения 31.12.2019;

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²


Бюджет субъекта
на 31 октября 2019 года

Всего: 13 201,70 тыс. руб



Сводный бюджет МО
на 31 октября 2019 года

Всего: 408,00 тыс. руб

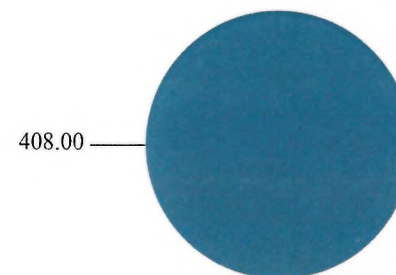

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 октября 2019 года




Всего: 0,00 тыс. руб


Фактически исполнено
 Риски исполнения
 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


Отсутствие отклонений
 Наличие отклонений
 Наличие критических отклонений
 Сведения не представлены
 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного</i>	13 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			13 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			13 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			13 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			<i>Утверждена региональная программа "Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа" на период 2019-2024 годов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. Значение: 1, на дату 01.10.2019</i>	01.10.2019	21.10.2019	Чинаров А. А.	Выполнено. Просрочка 20 дней.
2			<i>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Значение: 3, на дату 31.12.2024</i>	31.12.2024	31.12.2019		В работе.
2.1	РНП		Заключение соглашения о финансовой поддержке в 2019 году	01.11.2019	13.02.2019	Бездудный Ю. В.	Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2	КРП		Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2019 году	31.12.2019	31.12.2019	Чинаров А. А.	В работе.
2.2.1	РРП		Отчет о реализации мероприятий региональной программы повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа в 2019 году направлен в ГК Фонд ЖКХ РФ	31.12.2019	31.12.2019	Лешуков Н. Ю.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

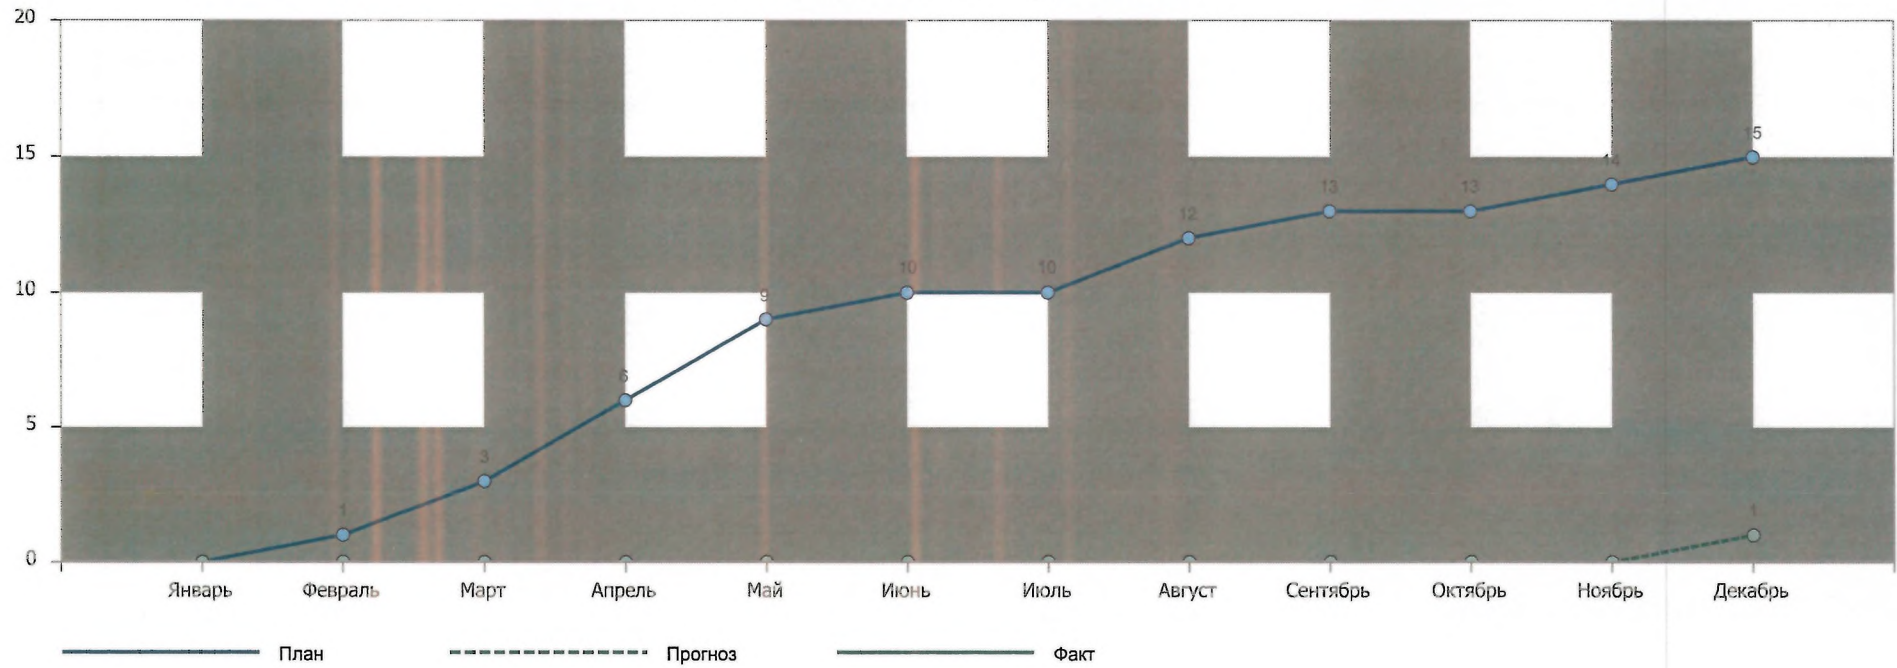


Рис. 1. "(G5-11) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

