

Руководитель  
регионального проекта —  
Остродумов Николай Анатольевич

(подпись)

03.03.2020






ОДОБРЕН

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

*"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"*

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

#### 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений







Сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020		Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1	РНП		Размещены извещения о проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	31.03.2020	31.03.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.1.1	РНП		Организация и проведение всероссийских мероприятий по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении (Чемпионат ЮАШ, финал Всероссийского конкурса ЮИД "Безопасное колесо", профильные смены по БДД)	31.03.2020	31.03.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.2	РРП		Размещены извещения о	31.05.2020	31.05.2020	Храпова Л. А.	

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)				В работе.
1.2.1	РНП		Организация и проведение Межгосударственного слета юных инспекторов движения (с участием стран СНГ)	31.05.2020	31.05.2020	Храпова Л. А.	В работе.
1.3			Документ утвержден (подписан)	31.03.2020	31.03.2020		В работе.
1.4			Документ утвержден (подписан)	31.05.2020	31.05.2020		В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

### Динамика достижения контрольных точек

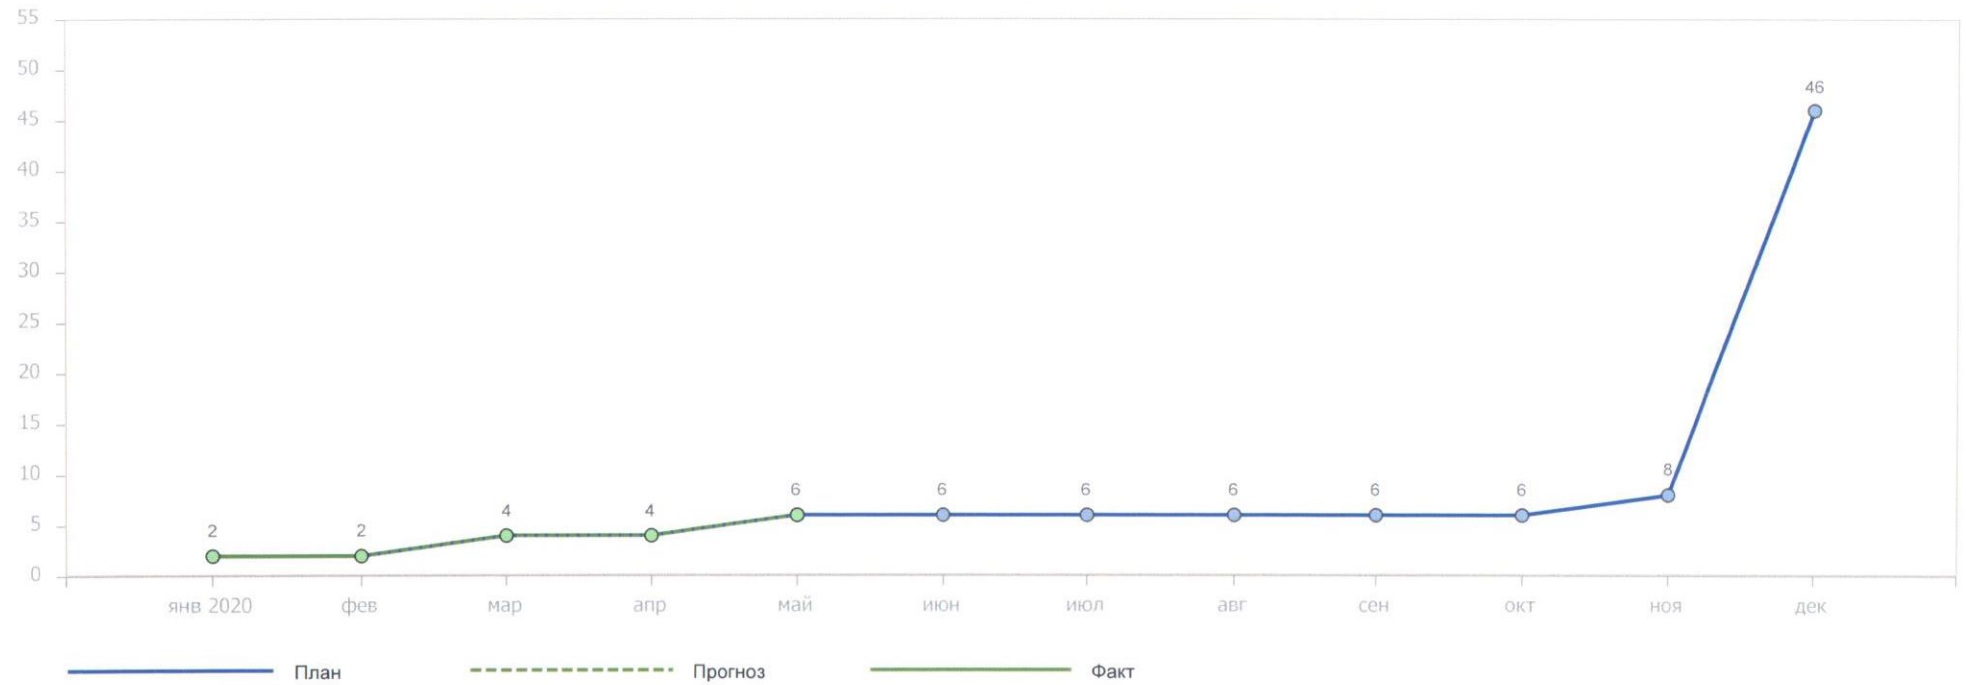


Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

